

**Data** 8/29/2023

Užsakovas Simona Kazlienė - Šilta Šiaurė  
Tel. nr. +370 625 02 837  
El. paštas [info@siltasiaure.lt](mailto:info@siltasiaure.lt)

**PASIŪLYMAS Nr.:** GARNYS

Grindų plotas 117.12 m<sup>2</sup>

#### **IŠORINĖ SIENA**

Dailylentė 18x146 AB klasė (vertikali, dažyta 2k.)  
Horizontali lotelė 28x45mm eglė C24, cc=400mm  
Lotelės 28x45mm eglė C24 (vėdinamas oro tarpas), cc=600mm  
Difuzinė plėvelė (vėjo izoliacija)  
Kalibruota mediena karkasui 45x245mm C24 eglė, cc=600mm  
Šilumos/garso izoliacija 250mm  
Garo izoliacinė plėvelė 200mk.  
Kalibruota mediena karkasui 45x45mm C24 eglė, cc=600mm  
Tvirtinimo elementai, sandarinimo medžiagos

#### **VIDINĖ SIENA**

Kalibruota mediena karkasui 45x95/145mm C24 eglė, cc=600mm  
Šilumos/garso izoliacija 100/150mm  
Tvirtinimo elementai, sandarinimo medžiagos

#### **STOGAS**

Skarda Classic  
Grebėstai 25x100mm cc=300mm  
Lotelės 28x45mm eglė C24 (vėdinamas oro tarpas), cc=600mm  
Difuzinė plėvelė (vėjo izoliacija)  
Kalibruota mediena karkasui 45x245mm C24 eglė, cc=600mm  
Šilumos/garso izoliacija 250mm  
Garo izoliacinė plėvelė 200mk.  
Kalibruota mediena karkasui 45x45mm C24 eglė, cc=600mm  
Tvirtinimo elementai, sandarinimo medžiagos

#### **PAPILDOMOS MEDŽIAGOS**

Klijuoto medžio sijos ir kolonos (GL24h)  
Lietaus sistema  
Sandėliukas su pastogėmis


#### **LANGAI IR DURYS**

PVC, trijų stiklų (A+ klasė)

#### **PROJEKTAVIMAS**

Gamybos brėžiniai

	77,582.00 €
PVM 21%	16,292.22 €
<b>VISO SU PVM</b>	<b>93,874.22 €</b>

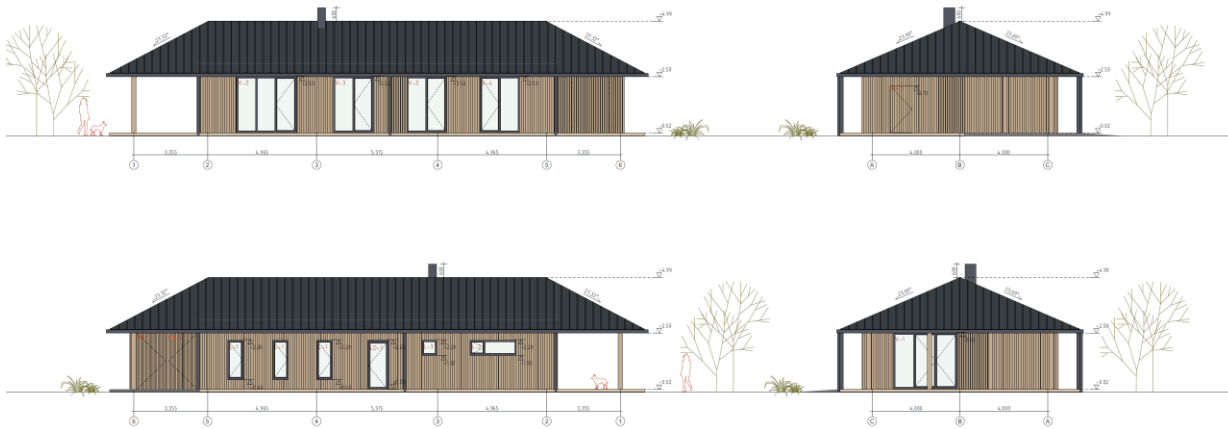

**Į kainą neįskaičiuota:**

- Pamatai ir kiti žemės darbai
- Montavimo darbai statybų vietoje
- Gaminių ir kitų medžiagų transportavimas į statybų vietą
- Elektros ir san technikos instaliacijos
- Šildymo ir vėdinimo sistemos
- Vidaus durys
- Krosnelė su kaminu
- Terasa
